



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ID EDS	4-EDS
Municipio	Anzá
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/02/2026
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Técnico responsable	Gendy Monroy Estrada
Contrato disponible	761_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5044
Vereda / sector	LAS LOMITAS
Dirección del centro / escenario	Cacao - Pueblo Duro 1-1, Anzá, Antioquia
Latitud	6.25
Longitud	-75.941944
Coordenadas formulario	-75.942 6.25
EDS más cercano	PLACA POLIDEPORTIVA VDA LOMITA
Zona EDS más cercano	RURAL

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	VALENTINA RUEDA, PLANEACIÓN
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	80
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	30
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	NO
Tipo de switch	
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----


Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

POSTES DE MADERA, SE INSTALARÁ FIREWALL FORTIGATE. LA INFRAESTRUCTURA (GABINETE, CANALIZACIÓN Y SOPORTES) SE INSTALARÁ EN EL PRIMER POSTE DE MADERA DE ILUMINACIÓN QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL ED. LA CONECTIVIDAD SE REALIZARÁ DESDE LA I.E. SEDE LAS LOMITAS. EL INTERNET DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ES SATELITAL DE VALOR +

10. Registro fotográfico

Fotografía 1 	Fotografía 2 
Fotografía 3	Fotografía 4

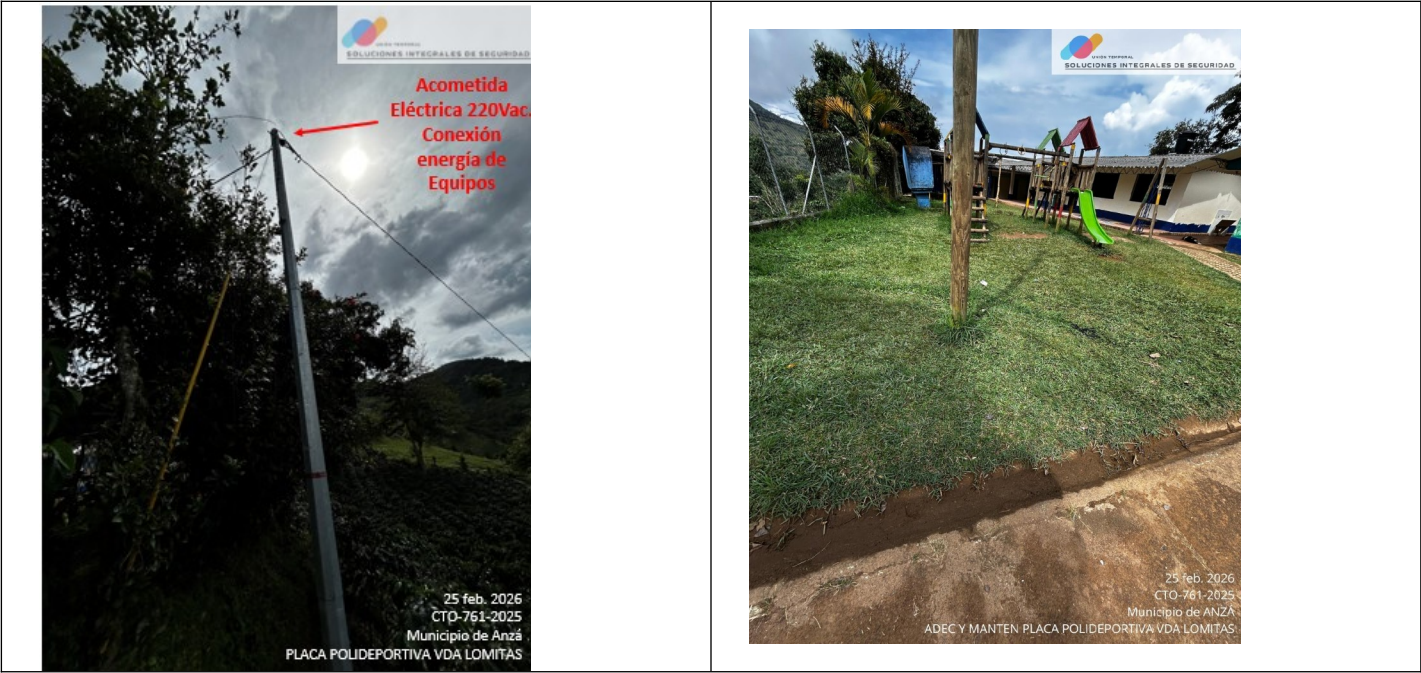

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	04/05/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	
