

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	105-EDS
Municipio	Caramanta
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	04/05/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5145
Vereda / sector	
Dirección del centro / escenario	Carrera 20 22 1-43, Caramanta, Antioquia
Latitud	5.5511083333333335
Longitud	-75.64426111111111
Coordenadas formulario	-75.644 5.551
EDS más cercano	COLISEO MUNICIPAL
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Secretario de Gobierno, Sergio López
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	0
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	SI
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	5°33'3.99"N, 75°38'39.34"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE,REFLECTOR
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	60
Cantidad reflector - un	1
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

La implementación e instalación del poste en fibra de vidrio, así como el suministro e instalación del gabinete y el tendido de fibra óptica para la conectividad, serán ejecutados por el aliado de conectividad del proyecto.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1




Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4

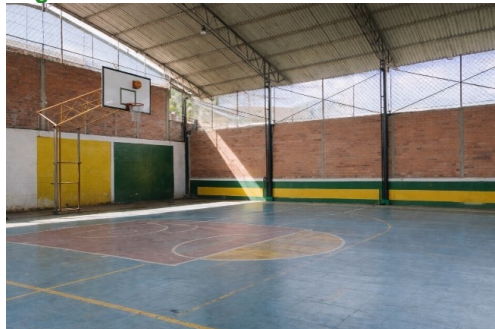

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	
